

PROPOSTA COMERCIAL

Operação GpsTecRS

operacaogpstecrs.com.br

Plataforma proprietária de gestão operacional para a GPSTec, já em produção, com a operação real da empresa rodando dentro dela. Esta proposta formaliza as condições de continuidade em assinatura ou de aquisição definitiva da plataforma.

O OBJETIVO DA PLATAFORMA

Colocar **toda a operação da GPSTec em um único lugar**, do orçamento à medição faturada, substituindo planilhas paralelas, grupos de mensagens e controles soltos por **esteiras visuais onde cada ordem de serviço carrega a própria história**: quem fez, quando, por quanto e o que falta. O resultado é uma operação **rastreável, previsível e auditável**, em que nada se perde entre setores e todo valor executado chega à medição.

O que a GPSTec ganha

- ✓ Três esteiras integradas (Implantação, Manutenção e Compras) que conversam entre si automaticamente
- ✓ Nenhuma OS perdida: cada card tem responsável, prazo, histórico e alerta de atraso (SLA)
- ✓ Do orçamento aprovado à compra do material, sem redigitação e sem planilha intermediária
- ✓ Faturamento protegido: medição com rateio por chamado e centro de resultado
- ✓ Relatórios por competência e por CR prontos para conferência e fechamento

A operação hoje, dentro da plataforma

Números reais extraídos do sistema em produção, de 23/06/2026 a 26/08/2026, pouco mais de dois meses de uso.

458

ordens de serviço registradas

329

já encerradas com rastreio completo

R\$ 285 mil

movimentados e controlados

151

medições registradas para
faturamento

114

orçamentos e anexos em PDF no
sistema

O retorno da plataforma

Antes da plataforma, a operação era controlada em planilhas: sem fluxo visível, sem histórico por ordem de serviço e sem forma prática de saber o que havia sido executado e não cobrado. Os números abaixo saíram do sistema em produção e mostram o que passou a ser **rastreado, cobrável e auditável**.

R\$ 131.851,95

receita rastreada por
competência em 3 meses de uso

R\$ 202.692,41

em orçamentos registrados e
acompanhados até o
fechamento

R\$ 14.850,00

em visitas cobradas, com 94
registros formais

A plataforma, em telas reais

Capturas do ambiente em produção. Os dados exibidos são da operação corrente da GPSTec.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso
Coordenador

Esteira de Manutenção

Serviços extras e orçamentos - 432 cards

Pesquisar cards...

Filtros

+ Nova entrada

Agendame... 13

Agenda a OS antes de
entrar na rotina do dia

R\$ 4.317,22

#404

Em andamento

MARIO FARINON

Manhã

Baixa

1d 16h

FF

#398

Em andamento

MAURO BOHRER

Manhã

Baixa

4d 18h

FF

#361-C388

Em andamento

ANTONIO CHIARELLO

Complementar

Baixa

23h

JC

R\$ 407,25

#374-C387

Em andamento

Rotina 12

Administrativo lança
todas as OS do dia

R\$ 782,00

Seg., 24/08

#391

Em andamento

UNIÃO SUL BRASILEIRA...

Tarde

Baixa

17h

FF

#413

Em andamento

DAF

Manhã

Baixa

1d 16h

JC

#301

Em andamento

NARA SERAFINI

Tarde

Baixa

4d 23h

FF

Qua., 26/08

Cheque 8

Supervisão confere
cada OS, OK - RQ - Orçar

R\$ 4.918,26

#426

Em andamento

TOP 10 - OBRA SOCIAL SANT...

Tarde

Baixa

17h

FF

#423

Em andamento

TGF

Tarde

Baixa

1h

FF

#402

Em andamento

MARIA LUCIA LOBATO...

Tarde

Baixa

17h

FF

#394-C397

Em andamento

COND. PARQUE CASTOR...

Orçamento 1

Administrativo gera o
orçamento e envia ao...

#217-C279

Em andamento

AMBEV

Complementar

Baixa

15d 21h

JC

Orçamentos 52 - R\$ 95.920,29

Aguardand... 17

Aguardando o retorno
do cliente (7 dias --)

R\$ 36.305,33

#415-C429

Em andamento

DRC - WOSS

Complementar

Baixa

1h

D

R\$ 215,00

#406-C412

Em andamento

COND. CAÇAPAVA

Complementar

Baixa

1d 1h

JC

R\$ 350,00

#363-C411

Em andamento

JOÃO FRANCISCO...

Complementar

Baixa

23h

JC

R\$ 752,00

#407-C409

Não Aprov... 31

Cliente reprovou -- o
volta ao Orçamento p...

R\$ 52.203,79

#314-C333

Em andamento

ESTRUTURAL

Complementar

Baixa

1h

D

R\$ 7.963,30

#325-C331

Em andamento

CONDOMINIO EDIFICIO VIL...

Complementar

Baixa

4d 18h

D

R\$ 632,00

#294-C326

Em andamento

PERONDDI ADVOCACIA ...

Complementar

Baixa

4d 21h

D

R\$ 2.283,40

#294-C322

Aprovado 4

Cliente aprovou -- o
card segue para a...

R\$ 7.411,17

#359-C364

Em andamento

ADM. MOVEIS CERTA

Complementar

Baixa

0h

JC

R\$ 464,85

#204-C206

Em andamento

COND OSVALDO...

Complementar

Baixa

0h

JC

R\$ 1.634,67

#176-C182

Em andamento

CENTRO CLINICO...

Complementar

Baixa

6d 23h

D

R\$ 2.077,75

Medição 25

Faturamento e geração
do relatório

R\$ 3.134,65

#418

Em andamento

ELEVADORES OTIS

Manhã

Baixa

17h

FF

#416

Em andamento

ARNALDO RIZZARO

Manhã

Baixa

17h

FF

#415

Em andamento

DRC - WOSS

Manhã

Baixa

17h

FF

#410

Em andamento

OUTLIN

Encerrados 321

OS de rotina encerrada
no Cheque (OK)

R\$ 95.808,41

#429

Em andamento

OBRA SANTA LUIZA

Tarde

Baixa

17h

FF

#427

Em andamento

COND. VIA APPIA

Tarde

Baixa

17h

FF

#424

Em andamento

GLOBAL POWER

Tarde

Baixa

17h

FF

#419

Em andamento

COND. CA...

Esteira de Manutenção: o coração da operação, da abertura da OS ao encerramento, passando por cheque, orçamento (aguardando, não aprovado, aprovado) e medição. Cada card mostra turno, criticidade, valor e há quanto tempo está parado.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso

Coordenador

Esteira de Implantação

Novos projetos · Comercial → Medição · 15 cards

Pesquisar cards...

Filtros

Nova entrada

Comercial

0

Cadastro do projeto, valores e modalidade...

Sem cards

Coordenação · ...

3

Cheque da Coordenação → envia o card para a esteira...

R\$ 2.143,53

#15

Em andamento

CARWAY SUL VEICULOS LTDA

Média

Locação

19h

R\$ 0,00

#14

Em andamento

SANDRA REGINA CAMPANI...

Média

Venda

Urgente

19h

R\$ 1.699,53

#13

Em andamento

CONSULADO DE PORTUGAL EM...

Média

Venda

23h

R\$ 444,00

Monitoramento

0

Cria a conta no software central e gera os dados de...

Sem cards

Técnica · Exec...

2

Instala, testa a conexão e aponta a conclusão

R\$ 6.359,61

#10

Em andamento

COOPERATIVA DE CREDITO DE...

Média

Venda

Conta 7990

25d 21h

R\$ 6.359,60

#9

Em andamento

DALLASANTA - EMPREENDIMEN...

Alta

Venda

Conta E036

5d 18h

R\$ 0,01

#5

Em andamento

COOPERATIVA DE CREDITO DE...

Média

Venda

CR 56087

Conta 0544

21d 19h

R\$ 2.270,48

Cheque · Moni...

2

Revisa usuários/senhas, setorização, equipamento...

R\$ 5.255,34

#11

Em andamento

TGF CONSTRUTORA...

Média

Locação

Conta 0551

13d 20h

R\$ 2.984,86

Coordenação · ...

0

OK de qualidade e checklist de obra pronta

Sem cards

Medição

0

Faturamento do cliente

Sem cards

Encerrados

8

Projetos faturados e concluídos

R\$ 22.670,24

#11

Finalizado

COOP DE ECON E CRED MUTUO...

Média

Venda

CR 93811

Conta 0557

R\$ 6.377,26

#10

Finalizado

FUNDACAO ASSISTENCIAL E...

Média

Venda

CR 31451

Conta 6972

R\$ 0,01

#10

Finalizado

CONDOMÍNIO INDUSTRIAL...

Média

Locação

Conta 0546

R\$ 1.333,18

#8

Finalizado

CESAR AUGUSTO

Esteira de Implantação: novos projetos do comercial à medição, com aprovação da coordenação, monitoramento, execução técnica e auditoria de qualidade.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso

Coordenador

Esteira de Compras

Orçamentos aprovados · Separação → Entrega · 11 cards

Pesquisar cards...

Filtros

Cadastrar orçamento

Nova entrada

Separação

3

Almoxarifado marca cada item em estoque...

R\$ 2.229,70

#390-C409

Em andamento

CONDOMINIO EDIF CENTRO...

Complementar

Média

1h

R\$ 340,20

#298-C368

Em andamento

SOUTH SERVICE...

Complementar

Tarde

Média

1d 20h

R\$ 1.250,00

#312-C313

Em andamento

CONSELHO REGIONAL DE...

Complementar

Baixa

18h

R\$ 639,50

Classificação

2

Coordenador aponta tipo de custo + centro...

R\$ 758,60

#410-C408

Em andamento

OUTLIN COMERCIO D...

Complementar

Baixa

1d 1h

R\$ 578,60

#292-C337

Em andamento

CONDOMÍNIO WORK E...

Complementar

Baixa

17h

R\$ 180,00

Pedido ao F...

4

Suprimentos faz o pedido: fornecedor e n...

R\$ 31.920,66

#405-C410

Em andamento

BARUFALDI AFVOGADOS

Complementar

Baixa

1d 17h

R\$ 858,00

#13

Em andamento

MARSUL INDUSTRIA E...

Implantação

Média

Locação

Urgente

4d 23h

R\$ 29.843,46

#345-C367

Em andamento

SCHUBERT

Complementar

Baixa

6d 17h

R\$ 915,20

Portal interno

0

Tabela de ...

0

Processo interno (outro portal)

Sem cards

Revisão de ...

0

Processo interno (outro portal)

Sem cards

Solicitação...

0

Processo interno (outro portal)

Sem cards

Pedido de C...

0

Abertura de chamado para o pedido de...

Sem cards

PC enviado

0

Pedido de compra enviado ao fornecedor

Sem cards

Entrega

2

Data de entrega por item - concluída, a OS...

R\$ 1.417,31

#178-C202

Em andamento

FRIEDERICH WILHELM B...

Complementar

Baixa

11d 23h

R\$ 731,00

#102-C107-C201

Em andamento

SOCIEDADE LA SALLE


Complementar

Alta

11d 23h

R\$ 686,31

Esteira de Compras: orçamentos aprovados viram compra de material, com separação de estoque, classificação por centro de custo, pedido ao fornecedor, portal interno e entrega, devolvendo o card à esteira de origem.

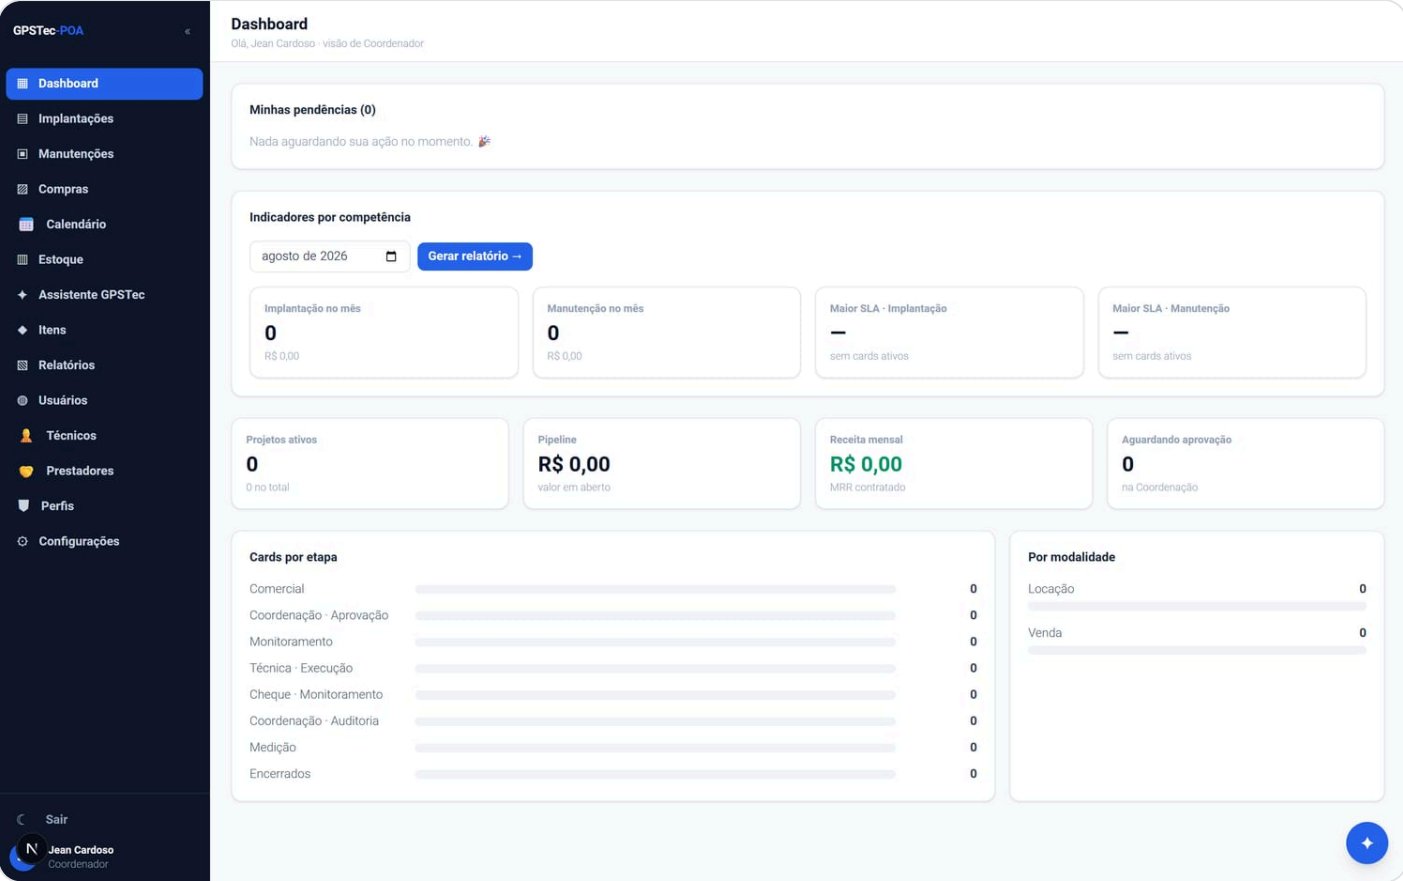

Dashboard: visão executiva do mês, com volume por esteira, valores, cards parados além do prazo e distribuição por etapa.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso
Coordenador

Relatórios

Esteiras por competência (Implantação + Manutenção)

Esteiras

Por cliente

Medição

Competência

Agosto/2026

Imprimir / PDF

GPSTec-POA – Segurança Eletrônica

Resultados das esteiras - Competência Agosto/2026

Implantação

R\$ 14.029,96

4 card(s)

Manutenção (encerrados)

R\$ 28.864,23

152 card(s)

Visitas cobradas

R\$ 5.830,00

26 card(s)

Visitas não cobradas

96

visita(s) no período - 14 isenta(s)

Total geral

R\$ 42.894,19

156 card(s)

IMPLANTAÇÃO - 4 CARD(S)

Código	Cliente	CR	Etap	Status	Origem do valor	Valor
#11	COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA	93811 - 91938 - 32201	Encerrados	Finalizado	Medição	R\$ 12.615,78
#10	FUNDACAO ASSISTENCIAL E PREVIDENCIARIA DA EXTEN RURAL NO RS	31451	Encerrados	Finalizado	Medição	R\$ 80,00
#10	CONDOMÍNIO INDUSTRIAL SINOSPLEX COMPLEXO EMPRESARIAL	97714 - 97715	Encerrados	Finalizado	Medição	R\$ 1.333,18
#6	RUDDER SEGURANCA- ESTACIONAMENTO	32731	Encerrados	Finalizado	Medição	R\$ 1,00
Subtotal Implantação						R\$ 14.029,96

MANUTENÇÃO - ENCERRADOS - 152 CARD(S)

Código	Cliente	CR	Etap	Status	Origem do valor	Valor
#429	OBRA SANTA LUIZA	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#427	COND. VIA APPIA	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#424	GLOBAL POWER	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#419	COND. CARINA	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#414	CENTRO CLINICO GAUCHO	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#410	LABORATORIO DO PÉ	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#408	KAIZEN KLOG	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#405	BARUFALDI AFVOGADOS	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#399	CLEBER RIBEIRO ALVARES SILVA	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00
#398	COND. CENTRO PROFISSIONAL MONTENEGRO	—	Encerrados	Em andamento	—	R\$ 0,00

Relatórios: fechamento por competência com filtro em cada coluna, totais por centro de resultado e recorte de visitas cobradas e isentas. Pronto para imprimir ou gerar PDF.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso
Coordenador

Calendário

Semana - 32 visita(s) - 8 orçamento(s) - 2 rotina(s) a agenda

Manhã Tarde Dia Não cobrado

Hoje

23 de ago. - 29 de ago. de 2026

ATENÇÃO, os técnicos MATHEUS SALAZAR, PATRICK, RAFAEL LEARDI, RENAN COSTA estão sem OS no dia de HOJE

SEG
24 ago.

ORÇAMENTOS - 3

20/08/2026 - 25/08/2026
JOSE CICERO DINATO
Técnico: GUILHERME (FR TEC)
Região: PETROPOLIS
Nº orçamento: 507/2026

19/08/2026 - 24/08/2026
ETE IRMÃO PEDRO
Técnico: JESSI DIEMIS
Região: FLORESTA
Nº orçamento: 501/2026

20/08/2026 - 24/08/2026
KAIZEN KLOG
Técnico: GUILHERME (FR TEC)
Região: ANCHIETA
Nº orçamento: 469/2026

MANHÃ - 5

08:00 - 12:00
Não Cobrado
BARUFALDI AFVOGADOS
Técnico: JESSI DIEMIS
Auxiliar: ANDRE
Tipo: LEVANTAMENTO
Setor: ALARME
Região: AUXILIADORA
Agendado: Sim

08:00 - 12:00
Cobrado
CLEBER RIBEIRO ALVARES SILVA
Técnico: EDUARDO MENEZES
Auxiliar: -
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: ALARME

TER
25 ago.

ORÇAMENTOS - 4

25/08/2026 - 25/08/2026
COND. PARQUE CASTOR FARROUPILHA
Técnico: JESSI DIEMIS
Região: BOM FIM
Nº orçamento: 530/2026

25/08/2026 - 25/08/2026
CONDOMINIO SOLAR EL GRECO
Técnico: ANDRE
Região: Petrópolis
Nº orçamento: 523/2026

25/08/2026 - 25/08/2026
CLEBER RIBEIRO
Técnico: RENAN COSTA
Região: VILA NOVA
Nº orçamento: 522/2026

20/08/2026 - 25/08/2026
JOSE CICERO DINATO
Técnico: GUILHERME (FR TEC)
Região: PETROPOLIS
Nº orçamento: 507/2026

MANHÃ - 7

08:00 - 12:00
Cobrado
ARNALDO RIZZARO
Técnico: JESSI
Auxiliar: ANDRE
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: CFTV
Região: MOINHOS DE VENTO
Agendado: Sim

QUA
26 ago.

MANHÃ - 6

08:00 - 12:00
Não Cobrado
SPRINGER CARRIER
Técnico: LUIS
Auxiliar: VINICIUS
Tipo: manutenção
Setor: cftv
Região: canoas
Agendado: Sim

08:00 - 12:00
Cobrado
CLUBE SOCIAL PERTENCE
Técnico: JESSI DIEMIS
Auxiliar: ANDRE
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: ALARME
Região: PARTENON
Agendado: Sim

08:00 - 12:00
Cobrado
COND. CARLOS CHAGAS
Técnico: JESSI DIEMIS
Auxiliar: ANDRE
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: ALARME
Região: INDEPENDENCIA
Agendado: Sim

08:00 - 12:00
Não Cobrado
OBRA SOCIAL SANTA LUIZA
Técnico: EVERSON
Auxiliar: -
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: ALARME
Região: FARRAPOS
Agendado: Sim

MANHÃ

QUI
27 ago.

MANHÃ - 1

08:00 - 12:00
Não Cobrado
STICC - SINTRACON
Técnico: RENAN COSTA
Auxiliar: EVERSON
Tipo: manutenção
Setor: alarme
Região: -
Agendado: Sim

MANHÃ

SEX
28 ago.

ORÇAMENTOS - 1

28/08/2026 - 28/08/2026
TATIANA DA CUNHA JARDIM
Técnico: JESSI DIEMIS
Região: NONOAI
Nº orçamento: 441/2026

MANHÃ - 1

08:00 - 12:00
Cobrado
MARIO FARINON
Técnico: JESSI DIEMIS
Auxiliar: ANDRE
Tipo: MANUTENÇÃO
Setor: ALARME
Região: VIAMÃO
Agendado: Sim

Calendário: agenda de visitas e execuções por técnico, com período de obra e localização do atendimento.

GPSTec-POA

Dashboard

Implantações

Manutenções

Compras

Calendário

Estoque

Assistente GPSTec

Itens

Relatórios

Usuários

Técnicos

Prestadores

Perfis

Configurações

Sair

Jean Cardoso
Coordenador

Perfis e permissões

Defina o que cada perfil pode fazer. O Coordenador tem acesso total.

Comercial

Cadastra novos projetos, define modalidade e valores.

Restaurar padrão Salvar

Capacidades

☒ Criar cards de Implantação

☒ Criar cards de Manutenção

☒ Editar dados do card

☒ Excluir card

☐ Gerar relatórios

☒ Gerenciar itens

☐ Gerenciar usuários

Etapas que o perfil executa

Onde o perfil pode avançar/agir e editar os cards.

IMPLANTAÇÃO

☒ Comercial

☐ Coordenação - Aprovação

☐ Almoxarifado

☐ Suprimentos

☐ Monitoramento

☐ Técnica

☐ Cheque - Monitoramento

☐ Coordenação - Auditoria

MANUTENÇÃO

☐ Agendamento

☐ Rotina

☐ Cheque

☐ Orçamento

☐ Aguardando

☐ Não Aprovado

☐ Aprovado

COMPRAS

☐ Separação

☐ Classificação

☐ Pedido ao Fornecedor

☐ Tabela de Valores

☐ Revisão de Valores

☐ Solicitação de Compra

☐ Pedido de Compra

☐ PC enviado ao Fornecedor


☐ Entrega

MEDIÇÃO / ENCERRAMENTO (AMBAS)

☐ Medição

☐ Encerrados

Perfis e permissões: cada setor enxerga e executa apenas o que lhe cabe. As regras são configuráveis pela coordenação, sem depender de programação.

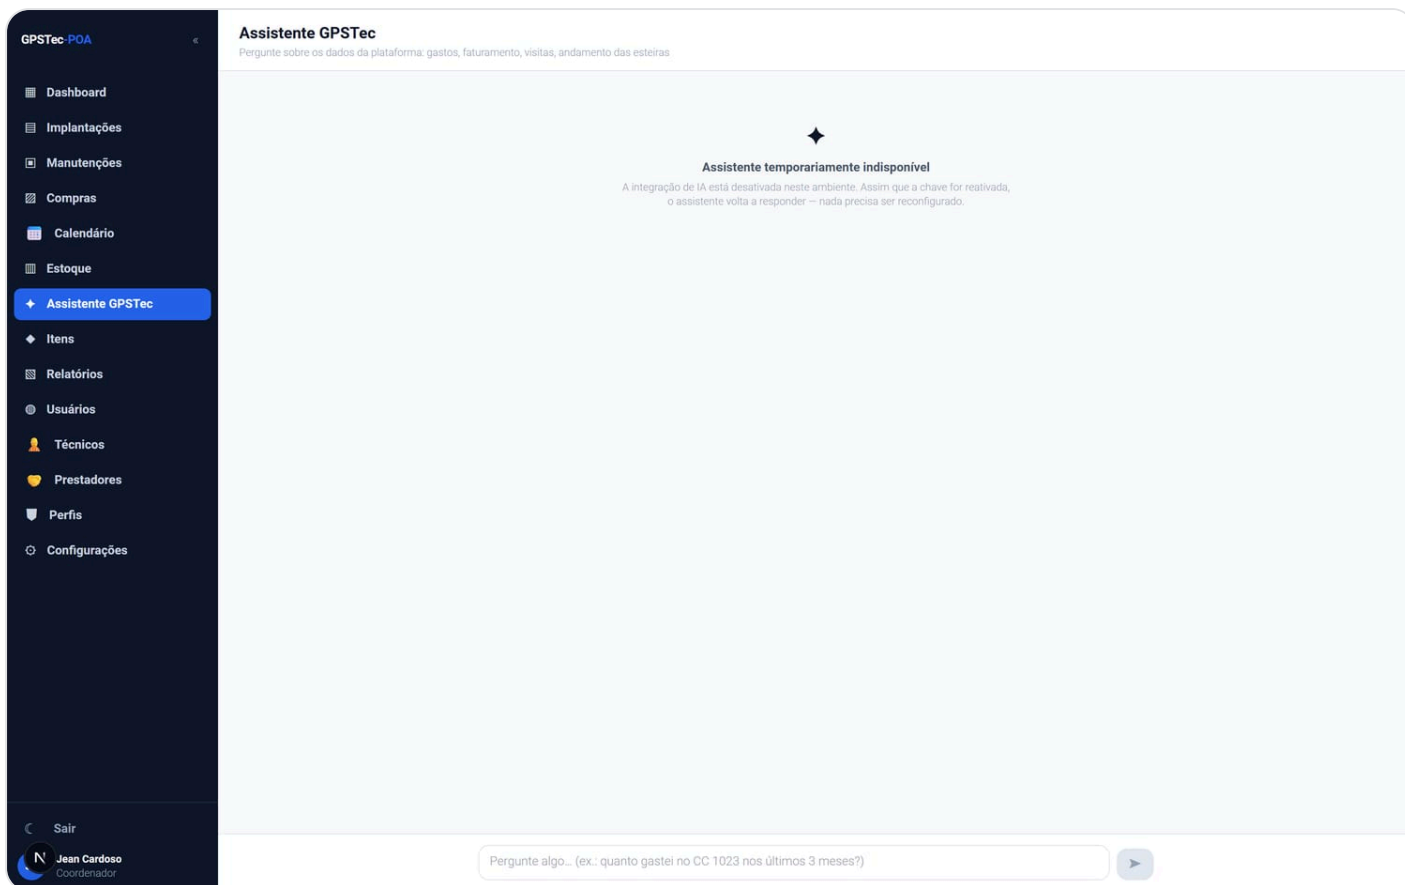

Assistente GpsTecRS: consulta em linguagem natural sobre os dados da operação, como gastos por centro de custo, faturamento por competência, visitas. Módulo opcional (ver escopo).

Modelo 1: Assinatura mensal (SaaS)

A ARV LABS mantém a plataforma no ar, com hospedagem, backup, suporte, correções de segurança e **20 horas mensais de evolução** incluídas. A GPSTec usa o sistema sem se preocupar com infraestrutura.

Faixas por número de usuários

USUÁRIOS COM ACESSO	MENSALIDADE	CONTRATO 24 MESES
Até 10 usuários	R\$ 1.980,00	R\$ 47.520,00
11 a 15 usuários	R\$ 2.430,00	R\$ 58.320,00
16 a 20 usuários	R\$ 2.880,00	R\$ 69.120,00
21 a 25 usuários	R\$ 3.330,00	R\$ 79.920,00
26 a 30 usuários	R\$ 3.780,00	R\$ 90.720,00

Base de **R\$ 1.980,00/mês para até 10 usuários**, com acréscimo de **R\$ 450,00** a cada 5 usuários adicionais. O enquadramento é revisto apenas quando a faixa muda. Inclusões e substituições dentro da mesma faixa não alteram o valor.

A receita que estava invisível

O QUE A PLATAFORMA REVELOU

Das **327 visitas** realizadas no período, **171 saíram sem cobrança registrada** e apenas 20 foram formalmente isentadas por estarem vinculadas a um orçamento aprovado. Ao ticket médio praticado de **R\$ 157,98**, essas visitas representam **R\$ 27.014,58** em receita potencial que a gestão passou a enxergar.

Na planilha, essa distinção não existia: visita isenta e visita esquecida eram a mesma linha em branco. Hoje cada visita tem tipo, valor, justificativa de isenção e número do orçamento que a dispensou, e o relatório separa as duas situações automaticamente.

O PONTO DE EQUILÍBRIO

A mensalidade de **R\$ 1.980,00** equivale a **13 visitas** ao ticket médio da GPSTec. Recuperar 13 cobranças por mês, de uma média de **57 visitas mensais** que hoje saem sem cobrança, já paga a plataforma inteira.

Em relação ao volume financeiro que passa pelo sistema, a assinatura representa **4.5% da receita rastreada** no período.

Os valores acima são de receita registrada e controlada, não de margem: a apuração de lucro depende dos custos internos da GPSTec (equipe, deslocamento e material), que não transitam pela plataforma. O ganho demonstrado está na **redução de perda e na visibilidade do que pode ser cobrado**.

Formas de pagamento no contrato de 24 meses (até 10 usuários)

OPÇÃO A

Mensal

Por mês

R\$ 1.980,00

Total em 24 meses

R\$ 47.520,00

✓ Sem desembolso inicial

✓ Faturamento todo dia 5

✓ Reajuste anual pelo IPCA

OPÇÃO B

Semestral

5% de desconto

Por semestre

R\$ 11.286,00

Total em 24 meses

R\$ 45.144,00

Economia de R\$ 2.376,00

✓ 4 pagamentos antecipados

✓ Valor travado no semestre

OPÇÃO C

Anual

10% de desconto

Por ano

R\$ 21.384,00

Total em 24 meses

R\$ 42.768,00

Economia de R\$ 4.752,00

✓ 2 pagamentos antecipados

✓ Valor travado no ano

OPÇÃO D (RECOMENDADA)

À vista (24 meses)

15% de desconto

Pagamento único

R\$ 40.392,00

Equivale a

R\$ 1.683,00/mês

Economia de R\$ 7.128,00, o equivalente a 3,6 mensalidades

✓ Sem reajuste durante os 24 meses

✓ Prioridade na fila de evoluções

→ Nota fiscal integral na contratação

Modelo 2: Aquisição definitiva da plataforma

A GPSTec passa a ser **proprietária da plataforma**: licença perpétua, código-fonte entregue e total autonomia para operar, hospedar e evoluir o sistema como quiser, sem mensalidade de uso.

AQUISIÇÃO		OPCIONAL	
Licença perpétua + código-fonte		Manutenção e evolução	
à vista ou em 6x			
Valor da plataforma	R\$ 150.000,00	Por ano (a partir do 4º mês)	R\$ 22.500,00
À vista	R\$ 135.000,00	Equivale a	R\$ 1.875,00/mês
Em 6 parcelas	R\$ 25.000,00	Hora de evolução no pacote	R\$ 93,75
✓ Código-fonte completo entregue em repositório próprio da GPSTec ✓ Licença perpétua e irrevogável de uso, sem limite de usuários ✓ Banco de dados e histórico completo da operação ✓ Documentação técnica e transferência de conhecimento (16h) ✓ 90 dias de garantia e suporte à transição inclusos → Infraestrutura (hospedagem e banco) passa a ser contratada pela GPSTec		✓ 20 horas por mês para melhorias e evoluções ✓ Correções e atualizações de segurança, sem consumir horas ✓ Suporte técnico em horário comercial ✓ Monitoramento e backup verificados → Contratação livre, podendo ser dispensada a qualquer momento	

Horas de evolução: pacote fechado ou por demanda

As melhorias e evoluções pedidas pela GPSTec consomem horas de desenvolvimento. Existem duas formas de contratar essas horas, e a GPSTec escolhe a que fizer mais sentido para o volume de mudanças que pretende pedir.

FORMA DE CONTRATAÇÃO	VALOR	HORA EFETIVA	QUANDO COMPENSA
Pacote mensal 20 horas inclusas por mês	R\$ 1.875,00/mês	R\$ 93,75	A partir de 13 horas de uso no mês
Hora avulsa, por demanda sem pacote e sem mensalidade	R\$ 150,00/hora	R\$ 150,00	Uso eventual, abaixo de 12 horas no mês

O pacote sai **37,5% mais barato por hora**: as mesmas 20 horas compradas avulsas custariam R\$ 3.000,00, contra R\$ 1.875,00 no pacote. O ponto de equilíbrio fica em **12,5 horas por mês**: abaixo disso a hora avulsa é mais vantajosa, acima disso o pacote é. A GPSTec não fica presa à escolha e pode migrar de uma forma para a outra a cada renovação.

COMO AS HORAS FUNCIONAM

- ✓ **Correção de defeito não consome hora.** Se algo que já funcionava parou de funcionar, o conserto é obrigação da ARV LABS.
- ✓ **Atualização de segurança não consome hora.** Entra como manutenção, não como evolução.
- ✓ **As horas valem para melhorias:** campos novos, relatórios, regras de negócio, ajustes de tela e integrações simples.
- ✓ **Toda demanda é estimada e aprovada antes** de começar. Nada é executado, nem cobrado, sem o aceite da GPSTec.

VALE PARA OS DOIS MODELOS

- ✓ **Na assinatura**, as 20 horas mensais já estão inclusas nos R\$ 1.980,00, junto com hospedagem, backup e suporte.
- ✓ **Na aquisição**, as 20 horas vêm no pacote opcional de manutenção, de R\$ 1.875,00 por mês.
- ✓ Em qualquer um dos dois, a hora adicional além do pacote é cobrada a **R\$ 150,00**.
- ✓ Horas não utilizadas não são acumuladas para o mês seguinte.

Assinar ou adquirir? O que pesa em cada caminho

HORIZONTE	ASSINATURA (R\$ 1.980,00/MÊS)	AQUISIÇÃO À VISTA	DIFERENÇA
24 meses	R\$ 47.520,00	R\$ 135.000,00	assinatura custa menos
36 meses	R\$ 71.280,00	R\$ 135.000,00	assinatura custa menos
60 meses	R\$ 118.800,00	R\$ 135.000,00	assinatura custa menos
68 meses	R\$ 134.640,00	R\$ 135.000,00	equilíbrio financeiro

A comparação acima considera apenas desembolso. Ela mostra que **a assinatura é o caminho mais econômico em qualquer horizonte até 68 meses**, e é a escolha natural para quem quer previsibilidade de caixa sem assumir infraestrutura, atualização e suporte.

A aquisição não se justifica por economia, e sim por **propriedade**: a GPSTec passa a deter o código-fonte, a base de dados e a liberdade de operar, hospedar, alterar e expandir a plataforma sem depender de fornecedor, sem limite de usuários e sem mensalidade de uso. É a decisão de quem enxerga o sistema como **ativo da empresa**, e não como serviço contratado. Nesse caso, o valor deixa de ser despesa recorrente e passa a compor o patrimônio, com possibilidade de ativação contábil e amortização.

Escopo: o que está incluso

INCLUÍDO NOS DOIS MODELOS

- ✓ As três esteiras completas (Implantação, Manutenção e Compras)
- ✓ Dashboard, relatórios por competência e por centro de resultado
- ✓ Calendário de visitas e execuções por técnico
- ✓ Cadastro de usuários, perfis, permissões, técnicos e catálogo de itens
- ✓ Anexo de orçamentos e documentos em PDF
- ✓ Atualização em tempo real entre os usuários
- ✓ 20 horas mensais para melhorias, com hora adicional por demanda
- ✓ Domínio próprio operacaogpstecrs.com.br
- ✓ Segurança: sessão revogável, senha forte obrigatória, trilha de auditoria

CONTRATADO À PARTE

- ✓ Módulo de IA (leitura automática de orçamentos em PDF e Assistente): consumo cobrado pelo uso, mediante aprovação prévia
- ✓ Integrações com sistemas de terceiros (ERP, Sigma, WhatsApp)
- ✓ Aplicativo móvel nativo
- ✓ Novos módulos e esteiras fora do escopo atual

A plataforma já está preparada para religar o módulo de IA. Basta a autorização comercial.

Segurança da informação e LGPD

A plataforma passou por uma auditoria de segurança completa em agosto de 2026, e as correções identificadas já estão aplicadas em produção. O que segue não é intenção de projeto: é o que está implementado hoje e pode ser conferido no ambiente da GPSTec.

Proteção do acesso

IDENTIDADE E SESSÃO

- ✓ **Sessão revogável na hora.** A cada requisição o sistema confere no banco se o usuário continua ativo. Desativou o usuário, o acesso cai no mesmo instante, sem esperar o login expirar.
- ✓ **Senha forte obrigatória.** Mínimo de 8 caracteres, com troca obrigatória no primeiro acesso. A senha é gravada como hash bcrypt de custo 12, ou seja, nem a ARV LABS consegue ler a senha de um usuário.
- ✓ **Bloqueio de tentativa em massa.** No máximo 8 tentativas de login a cada 10 minutos por origem, o que inviabiliza ataque de força bruta.
- ✓ **Cookie protegido.** A sessão trafega em cookie httpOnly, Secure e SameSite, inacessível a scripts da página.

PERMISSÃO E RASTREABILIDADE

- ✓ **O perfil define o que cada um faz.** Cada usuário executa apenas as etapas liberadas ao seu perfil, e a GPSTec ajusta essa configuração sozinha, sem depender de alteração de código.
- ✓ **Sem elevação de privilégio.** Nenhum usuário consegue alterar o próprio perfil ou conceder a si mesmo uma permissão que não tem.
- ✓ **Trilha de auditoria.** Toda movimentação de card grava autor, data, setor e ação no histórico. Nada avança na esteira sem registro de quem fez.
- ✓ **Assistente restrito.** Quando ativo, o Assistente responde apenas ao perfil Coordenador.

Proteção dos dados e da infraestrutura

EM TRÂNSITO E EM REPOUSO

- ✓ **HTTPS obrigatório.** Todo o tráfego é criptografado, com HSTS de 2 anos incluindo subdomínios. O navegador se recusa a abrir a plataforma sem criptografia.
- ✓ **Banco criptografado em repouso,** com backup contínuo e restauração a ponto no tempo.
- ✓ **Anexos validados.** O sistema aceita somente PDF, conferindo a assinatura interna do arquivo e não apenas a extensão. Os anexos são servidos em modo isolado, sem permissão de executar script.
- ✓ **Segredos fora do código.** Senha do banco e chaves de integração ficam em variáveis de ambiente do provedor, nunca no código-fonte, o que preserva a segurança mesmo na entrega do código em caso de aquisição.

DEFESAS DO NAVEGADOR

- ✓ **Política de conteúdo (CSP)** restringindo a origem de tudo que a página carrega.
- ✓ **Bloqueio de incorporação.** A plataforma não pode ser embutida em site de terceiro, o que elimina o golpe de clique disfarçado.
- ✓ **Câmera, microfone e localização bloqueados** por política do próprio navegador.
- ✓ **Dependências monitoradas.** Na última verificação, em 26/08/2026, nenhuma vulnerabilidade conhecida afeta o código que roda em produção.

Que dados a plataforma trata, e o que ela não trata

DADOS TRATADOS

- ✓ **Usuários da GPSTec:** nome, e-mail corporativo, perfil e senha em hash.
- ✓ **Clientes atendidos:** nome ou razão social, documento, contato e endereço da unidade, necessários à execução do contrato de manutenção.
- ✓ **Operação:** ordens de serviço, orçamentos, medições, valores, técnico responsável e centro de resultado.

Vale o princípio da minimização: a plataforma coleta apenas o que é necessário para operar a ordem de serviço e faturar a competência.

O QUE A PLATAFORMA NÃO RECEBE

- ✓ **Nenhuma imagem, vídeo ou gravação** das centrais de monitoramento. A plataforma é de gestão operacional e não se conecta ao Sigma nem a qualquer sistema de câmeras.
- ✓ **Nenhum dado pessoal sensível** na definição do art. 5º, II da LGPD: saúde, biometria, origem racial, convicção religiosa ou opinião política.
- ✓ **Nenhum dado de consumidor final** dos clientes da GPSTec.
- ✓ **Nenhum dado bancário** ou meio de pagamento.

LGPD: quem responde pelo quê, em cada modelo

A responsabilidade legal muda conforme a GPSTec assine a plataforma ou adquira a plataforma. O quadro abaixo deixa a divisão explícita, e ela é reproduzida no contrato.

TEMA	MODELO 1 · ASSINATURA	MODELO 2 · AQUISIÇÃO
Papel na LGPD	GPSTec é controladora ARV LABS é operadora	GPSTec é controladora e operadora ARV LABS deixa de tratar os dados
Onde os dados ficam	Infraestrutura contratada e mantida pela ARV LABS	Infraestrutura da GPSTec, no provedor que ela escolher

TEMA	MODELO 1 · ASSINATURA	MODELO 2 · AQUISIÇÃO
Acordo de tratamento de dados	Anexo ao contrato de assinatura	Encerrado na entrega, junto com a revogação de acesso da ARV LABS
Backup e retenção	Responsabilidade da ARV LABS	Responsabilidade da GPSTec
Correções e atualizações de segurança	Inclusas na mensalidade	Somente com a manutenção anual contratada
Incidente de segurança	ARV LABS comunica a GPSTec em até 24 horas e apoia a notificação à ANPD	GPSTec conduz. A ARV LABS apoia se houver manutenção contratada
Atendimento a titular de dados	GPSTec responde. A ARV LABS fornece exportação e exclusão em até 5 dias úteis	GPSTec responde, com as ferramentas de exportação já embutidas na plataforma
Fim da relação	Exportação integral dos dados e eliminação das cópias em até 30 dias	Não se aplica: base e código já pertencem à GPSTec

Em qualquer um dos dois modelos, **os dados da operação são de propriedade exclusiva da GPSTec** e podem ser exportados a qualquer momento, em formato aberto, sem custo e sem carência.

Hospedagem e transferência internacional

Hoje a plataforma roda em nuvem com servidores nos Estados Unidos, situação prevista e permitida pelo art. 33 da LGPD para execução de contrato, com as garantias contratuais dos provedores. Se a GPSTec preferir manter a base em território nacional, **a hospedagem pode ser migrada para região no Brasil (São Paulo)**, sem alteração de funcionalidade e sem custo adicional de licença. É uma decisão da GPSTec, e a ARV LABS executa a migração.

Módulo de IA e envio a terceiros

Este é o único ponto em que dados sairiam da plataforma para um serviço externo, e por isso ele **vem desligado por padrão**. Enquanto o módulo estiver desativado, como está hoje, nenhuma informação da GPSTec é enviada a qualquer provedor de IA. Se a GPSTec autorizar a ativação, são enviados apenas dados de operação, como número de ordem de serviço, cliente, itens e valores. Senhas, credenciais e anexos completos nunca são transmitidos, e o provedor utilizado não emprega o conteúdo enviado por API para treinar modelos. A ativação depende de autorização formal por escrito da GPSTec e pode ser revertida a qualquer momento.
